



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772569
Website : www.banjarbarukota.go.id

TELAAHAN STAF

Kepada : Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru
Dari : Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Tanggal : 8 Juli 2025
Nomor : 922/ ~~184~~ /Adbang/SETDA/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Ijin Pelaksanaan Monitoring Ke SKPD Dalam Rangka Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru

I. Persoalan

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Monitoring Pengelolaan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 di Aula Gawi Sabarataan pada tanggal 8 juli 2025, dan laporan data fisik pembangunan yang bersumber Dana dari APBD Tahun 2025 pada setiap SKPD melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIABANG).

II. Praanggapan

Sehubungan dengan persoalan diatas, maka Bagian Administrasi Pembangunan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan perlu melaksanakan monitoring terhadap kevalidan/keabsahan data tersebut.

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

1. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

IV. Analisis

1. Berdasarkan hasil laporan dari seluruh SKPD tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan perlu melaksanakan monitoring fisik dimulai dari 0% - 100%.
2. Untuk mendukung tercapainya output pelaksanaan pembangunan Kota Banjarbaru proyek yang bersumber dari Dana APBD Kota Banjarbaru.

V. Kesimpulan

Maka dari itu perlu dibuat Surat Perintah Tugas sebagai dasar petugas yang akan melaksanakan monitoring dilapangan, agar capaian hasil fisik

pembangunan yang bersumber dari Dana APBD Kota Banjarbaru dapat di evaluasi.

VI. Saran

1. Mohon Persetujuan pelaksanaan kegiatan Monitoring terhadap paket-paket pekerjaan fisik yang baru selesai dilaksanakan proyek yang mendukung visi misi Wali Kota Banjarbaru.
2. Apabila Bapak sepakat dan setuju dengan jadwal tersebut (terlampir), maka dimohonkan dengan hormat kepada Bapak berkenan untuk memberikan persetujuan.

Plt. Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan,



Hj. Renyta Setyawati, SP., MT
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19711010 199803 2 009

Disposisi :

Plh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Pj. Sekretaris Daerah
YTH. Pj. Sekda <u>MOHON PERSETUJUAN</u> t 8/7-21	Acc 8/25 7/7

LAMPIRAN PELAKSANAAN MONITORING
REALISASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No.	Nama SKPD	Jumlah Paket Pekerjaan	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1 Paket	Rp 227.200.000,00	APBD
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1 Paket	Rp 20.000.000,00	APBD
3	Dinas Kesehatan	7 Paket	Rp 3.159.856.000,00	APBD
4	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Paket	Rp 157.500.000,00	APBD
5	Dinas Lingkungan Hidup	11 Paket	Rp 4.338.793.000,00	APBD
6	Kelurahan Guntung Payung	1 Paket	Rp 164.500.000,00	APBD
7	Kelurahan Komet	1 Paket	Rp 128.800.000,00	APBD
8	Kelurahan Landasan Ulin Timur	1 Paket	Rp 128.800.000,00	APBD
9	Kelurahan Loktabat Utara	1 Paket	Rp 128.800.000,00	APBD
10	Kelurahan Mentaos	2 Paket	Rp 142.100.000,00	APBD
11	Kelurahan Sungai Ulin	2 Paket	Rp 137.550.000,00	APBD



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : JL. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772569
Website : www.banjarbarukota.go.id

Banjarbaru, 12 Juli 2025

Nomor : 000.3.6/195/VII/ADBANG/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru TA 2025

Yth. (Daftar SKPD Terlampir)

di -
Banjarbaru

Dalam rangka optimalisasi penyerapan atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun 2025 serta untuk menindaklanjuti persetujuan Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru atas Telaahan Staf dari Bagian Administrasi Pembangunan nomor : 922/134/Adbang/SETDA/2025 hal Mohon Ijin Pelaksanaan Monitoring Ke SKPD Dalam Rangka Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru tanggal 8 Juli 2025, maka dengan ini Bagian Administrasi Pembangunan akan melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada Bulan April tahun 2025 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 dengan Realisasi Fisik (0%-100%). Pelaksanaan Monitoring dimulai pada tanggal : 28 – 31 Juli 2025, selama 4 (empat) hari kerja.

Untuk kelancaran pelaksanaan monitoring/kunjungan lapangan tersebut diminta Kepala SKPD dapat menginformasikan kepada PPK Kegiatan agar dapat mempersiapkan data pekerjaan termasuk realisasi fisik dan keuangannya.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

Pj. Sekretaris Daerah Kota
Banjarbaru,



SIRAJONI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197506101995011001

DAFTAR SKPD

Nomor : 000.3.6/195/VII/ADBANG/2025
Tanggal : 12 Juli 2025
Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru TA 2025

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru
3. Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru
6. Kelurahan Guntung Payung
7. Kelurahan Komet
8. Kelurahan Landasan Ulin Timur
9. Kelurahan Loktabat Utara
10. Kelurahan Mentaos
11. Kelurahan Sungai Ulin

Pj. Sekretaris Daerah Kota
Banjarbaru,



SIRAJONI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197506101995011001

LAPORAN HASIL MONITORING
PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
REALISASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

A. Dasar Pelaksanaan :

- 1. Telaahan Staf Nomor 922 / 134 / Adbang / SETDA / 2025 tanggal 8 Juli 2025 perihal Mohon Ijin Pelaksanaan Monitoring ke SKPD Dalam Rangka Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kota Banjarbaru
- 2. Surat Tugas Nomor 000.3.6 / 202 / VII / ADBANG / 2025 tanggal 18 Juli 2025.

B. Waktu Pelaksanaan :

- Hari : Senin - Kamis
- Tanggal : 28 – 31 Juli 2025
- Jam Pelaksanaan : Menyesuaikan dengan SKPD terkait

C. Pelaksana Monitoring :

- 1. Hj. Renyta Setyawati, SP, MT à Plt. Kapala Bagian Administrasi Pembangunan
- 2. Evelina Rahmi, ST, M.IL à Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 3. Jasman, SST à Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 4. Romy Rahmadani, A.Md à Pranata Komputer Mahir
- 5. Hj. Rumiah, S.Sos à Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
- 6. Faridi Rahmani, S.Pd à Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

D. Hasil Monitoring :

1. Hari Senin, tanggal 28 Juli 2025

a. Dinas Lingkungan Hidup

- Nama Pekerjaan : Pembangunan Pencucian Alat Berat
- Alamat : TPA Jl. Trans Gunung Kupang Kelurahan Cempaka
- Pagu Anggaran : Rp.193.770.000,-

Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

	
Foto Bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Tim Monitoring	Dokumentasi 0% Pembangunan Pencucian Alat Berat sebelum dilakukan pelaksanaan

- Nama Pekerjaan : Pengerasan Jalan
- Alamat : TPA Jl. Trans Gunung KupangKelurahan Cempaka
- Pagu Anggaran : Rp.199.810.000,-
- Catatan :

Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

	
Foto Bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Tim Monitoring	Dokumentasi 0% Pengerasan Jalan sebelum dilakukan pelaksanaan

Nama Pekerjaan : Pembangunan Drainase TPA
Alamat : TPA Jl. Trans Gunung KupangKelurahan Cempaka
Pagu Anggaran : Rp.199.500.000,-
Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

	
Foto Bersama pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan Tim Monitoring	Dokumentasi 0% Pembangunan Drainase TPA sebelum dilakukan pelaksanaan

Nama Pekerjaan : Instalasi Jaringan Air
Alamat : TPA Jl. Trans Gunung Kupang
Kelurahan Cempaka
Pagu Anggaran : Rp.200.070.000,-
Catatan :
Belum dilakukan pelaksanaan fisik pekerjaan karena masih dalam tahap proses pelelangan / e-purchasing / penunjukan langsung.

2. Hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025
- a. Kelurahan Guntung Payung
- Nama Pekerjaan : Pembuatan Drainase
- Alamat : Jl. Sapta Marga Blok F RT.007 RW.003
- Kelurahan Guntung Payung
- Pagu Anggaran : Rp.148.050.000,-
- Nama Pelaksana : Pokmas Rajawali
- Nomor Kontrak : 900 / 091 / Kec.LU

Tanggal Kontrak : 10 Juni 2025
Nilai Kontrak : Rp.148.050.000,-
Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
Realisasi Fisik : 60%
Realisasi Keuangan : Rp.100.000.000,- (67,55%)
Catatan :
Pembuatan drainase ini dilakukan karena saat hujan besar air larian menggenang di jalan sehingga merusak aspal.

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Guntung Payung dengan Tim Monitoring	Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Guntung Payung
	
Papan Proyek Pembuatan Drainase di Kelurahan Guntung Payung	Pekerjaan 60% Pembuatan Drainase di Kelurahan Guntung Payung

b. Kelurahan Loktabat Utara

Nama Pekerjaan : Pemasangan Paving / Bata Press
Alamat : RT.20 dan RT 37 Kelurahan Loktabat Utara
Pagu Anggaran : Rp.128.800.000,-
Nama Pelaksana : Pokmas Bergelora
Nomor Kontrak : 100.3.7.1 / 003 / MOU – SAPRAS / VI / Kec.BBU / 2025
Tanggal Kontrak : 2 Juni 2025
Nilai Kontrak : Rp.128.800.000,-
Waktu Pelaksanaan :90 Hari Kalender
Realisasi Fisik : 100%
Realisasi Keuangan : Rp.100.000.000,- (77,64%)
Catatan :
Pelaksanaan pemasangan paving / bata press sepanjang ±112 meter, terdiri dari lebar jalan = 1,45 meter panjangjalan = 38.2 meter, dan lebar jalan = 2,2 meter panjang jalan = 74,6 meter.

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Loktabat Utara dengan Tim Monitoring	Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Loktabat Utara
	
Papan Proyek Pemasangan Paving di Kelurahan Loktabat Utara	Pekerjaan 100% Pemasangan Paving di Kelurahan Loktabat Utara

c. Kelurahan Sungai Ulin

- Nama Pekerjaan : Pemasangan Paving / Bata Press
- Alamat : Jl. Sinar Baru RT.24RW.006 Kelurahan Sungai Ulin
- Pagu Anggaran : Rp.128.800.000,-
- Nama Pelaksana : Pokmas Giat Sejalur
- Nomor Kontrak : 100.3.7.1 / 007 / MOU – SAPRAS / VI / Kec.BBU / 2025
- Tanggal Kontrak : 2 Juni 2025
- Nilai Kontrak : Rp.128.800.000,-
- Waktu Pelaksanaan : 120 Hari Kalender
- Realisasi Fisik : 100%
- Realisasi Keuangan : Rp.100.000.000,- (77,64%)
- Catatan :
Pelaksanaan pemasangan paving / bata press sepanjang ± 368 m² dengan lebar jalan 2 meter.

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Sungai Ulin dengan Tim Monitoring	Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Sungai Ulin

	
Papan Proyek Pemasangan Paving di Kelurahan Sungai Ulin	Pekerjaan 100% Pemasangan Paving di Kelurahan Sungai Ulin

Nama Pekerjaan

: Penambahan Kanopi Parkiran dan Pembuatan Musholla

Alamat

: Kantor Kelurahan Sungai Ulin

Pagu Anggaran

: Rp.184.900.000,-

Nama Pelaksana

: CV. Palindangan Jaya Sabumi

Nomor Kontrak

: 000.3.2 / 048 / SPK / VI / SET - Kec.BBU

Tanggal Kontrak

: 10 Juni 2025

Nilai Kontrak

: Rp.184.900.000,-

Waktu Pelaksanaan

: 60 Hari Kalender

Realisasi Fisik

: 100%

Realisasi Keuangan

: Rp.184.900.000,- (100%)

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Sungai Ulin dengan Tim Monitoring	Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Sungai Ulin
	
Papan Proyek Penambahan Kanopi Parkiran dan Pembuatan Musholla di Kelurahan Sungai Ulin	Pekerjaan 100% Penambahan Kanopi Parkiran di Kelurahan Sungai Ulin

	
Pekerjaan 100% Pembuatan Musholla di Kelurahan Sungai Ulin	Pekerjaan 100% Pembuatan Tempat Wudhu di Kelurahan Sungai Ulin

d. Kelurahan Komet

- Nama Pekerjaan : Rehab Drainase dan Pembuatan Tutup Drainase
- Alamat : RW.003Kelurahan Komet
- Pagu Anggaran : Rp.128.800.000,-
- Nama Pelaksana : Pokmas Karya Bersama
- Nomor Kontrak : 100.3.7.1 / 007 / MOU – SAPRAS / VI / Kec.BBU / 2025
- Tanggal Kontrak : 2 Juni 2025
- Nilai Kontrak : Rp.128.800.000,-
- Waktu Pelaksanaan : 180 Hari Kalender
- Realisasi Fisik : 77,64%
- Realisasi Keuangan : Rp.100.000.000,- (67,55%)

Catatan :
 Pembuatan drainase ini dilaksanakan sepanjang Jl. Mawar ± 120 meter. Pada saat tim mendatangi konstruksi, pekerjaan diberhentikan sementara karena adanya kendala. Kendala pelaksanaan pekerjaan ini adanya mis komunikasi antara fasilitator dengan pihak tukang / pekerja, namun hal ini sudah dibijaksanai oleh pihak kelurahan sehingga fasilitator dapat meneruskan pekerjaan tersebut.

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Komet dengan Tim Monitoring	Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Komet

 Papan Proyek Rehab Drainase dan Pembuatan Tutup Drainase di Kelurahan Komet	 Dokumentasi (77,64%) Rehab Drainase dan Pembuatan Tutup Drainase di Kelurahan Komet
--	---

e. Kelurahan Mentaos

Nama Pekerjaan : Pemasangan Paving / Bata Press

Alamat : RT.003 RW.004, RT.003 RW.005, RT.004 RW.006

Kelurahan Komet

Pagu Anggaran : Rp.128.800.000,-

Nama Pelaksana : Pokmas Mentara

Nomor Kontrak : 100.3.7.1 / 005 / MOU – SAPRAS / VI / Kec.BBU / 2025

Tanggal Kontrak : 2 Juni 2025

Nilai Kontrak : Rp.128.800.000,-

Waktu Pelaksanaan : 120 Hari Kalender

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp.100.000.000,- (77,64%)

Catatan :
Pelaksanaan pemasangan paving / bata press sepanjang ± 368 meter dengan lebar jalan 2 meter terdiri dari 3 lokasi.

 Foto Bersama pihak Kelurahan Mentaos dengan Tim Monitoring	 Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Mentaos
---	--

 Papan Proyek Pemasangan Paving di Kelurahan Mentaos	 Dokumentasi (100%) Pemasangan Paving di Kelurahan Mentaos
--	---

13. Hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025

a. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Nama Pekerjaan : Bangunan Gedung Kantor

Alamat : UPT Pajak Wilayah 2 Jl. A. Yani KM.23,5
Komplek Sinar Lestari Kelurahan Landasan Ulin Utara

Pagu Anggaran : Rp.20.000.000,-

Nama Pelaksana : CV. Tata Laksana Konstruksi

Nomor Kontrak : 900 / 067 / UPT PD WIL II / BPPRD / 2025

Tanggal Kontrak : 11 Mei 2025

Nilai Kontrak : Rp.20.000.000,-

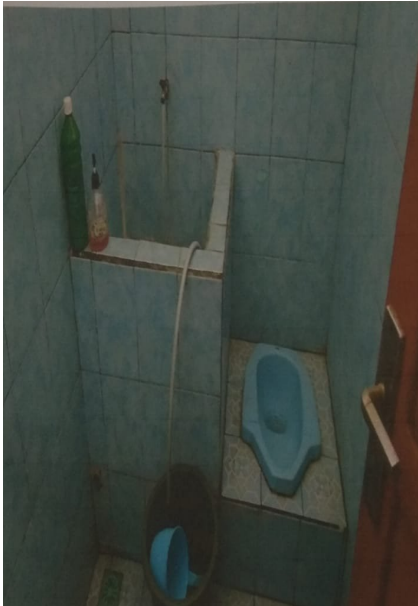
Waktu Pelaksanaan : 45 Hari Kalender

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp. 20.000.000,- (100%)

Catatan :
Pekerjaan Bangunan Gedung Kantor ini adalah perbaikan kamar mandi pada Kantor UPT Pajak Daerah Wilayah 2.

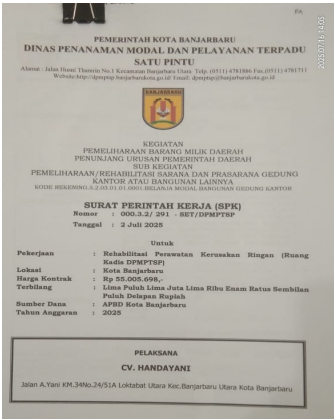
 Foto Bersama pihak UPT Pajak Daerah Wilayah 2 dengan Tim Monitoring	 Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak UPT Pajak Daerah Wilayah 2
--	---

	
Dokumentasi (0%) sebelum dilakukan perbaikan kamar mandi	Dokumentasi (100%) setelah dilakukan perbaikan kamar mandi

b. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Pekerjaan : Rehabilitasi Gudang Negara (Perawatan Kerusakan Ringan)
Alamat : Kantor DPMPTSP Jl. Husni Thamrin No.1
Kelurahan Komet
Pagu Anggaran : Rp.55.891.200,-
Nama Pelaksana : CV. Handayani
Nomor Kontrak : 000.3.2 / 291 – SET / DPMPTSP
Tanggal Kontrak : 2 Juli 2025
Nilai Kontrak : Rp.55.005.698,-
Waktu Pelaksanaan : 25 Hari Kalender
Realisasi Fisik : 100%
Realisasi Keuangan : Rp.55.005.698,- (100%)

Catatan :
Pekerjaan perawatan kerusakan ringan pada ruang Kepala DPMPTSP adalah perbaikan dinding ruang istirahat Kepala DPMPTSP dan penambahan sekat dan perluasan ruang pada kamar mandi pribadi ruang istirahat Kepala DPMPTSP.

	
Foto Bersama pihak DPMPTSP dengan Tim Monitoring	SPK Rehabilitasi Gudang Negara (Perawatan Kerusakan Ringan)

	
Dokumentasi (0%) sebelum dilakukan perbaikan dinding ruang istirahat Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru	Dokumentasi (100%) setelah dilakukan perbaikan dinding ruang istirahat Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru
	
Dokumentasi (0%) sebelum dilakukan penambahan sekat dan perluasan ruang pada kamar mandi pribadi ruang istirahat Kepala DPMPTSP	Dokumentasi (100%) setelah dilakukan penambahan sekat dan perluasan ruang pada kamar mandi pribadi ruang istirahat Kepala DPMPTSP

Nama Pekerjaan : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Alamat : Kantor DPMPTSP Jl. Husni Thamrin No.1 Kelurahan Komet

Pagu Anggaran : Rp.26.278.560,-

Nama Pelaksana : CV. Mitra Utama

Nomor Kontrak : 000.3.2 / 81 – UM / DPMPTSP

Tanggal Kontrak : 7 Maret 2025

Nilai Kontrak : Rp.26.100.000,-

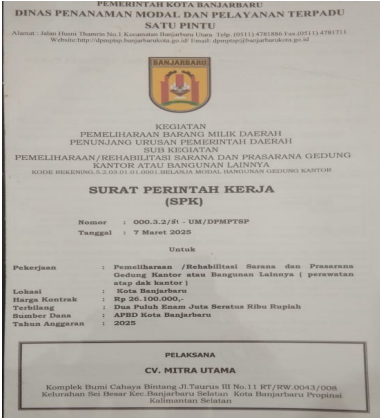
Waktu Pelaksanaan : 25 Hari Kalender

Realisasi Fisik : 100%

Realisasi Keuangan : Rp.26.100.000,- (100%)

Catatan :

Pekerjaan pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya ini adalah perawatan atap dak kantor DPMPTSP.

	
Foto Bersama pihak DPMPTSP dengan Tim Monitoring	SPK Perawatan Atap Dak Kantor DPMPTSP
	
Dokumentasi (0%) sebelum dilakukan Perawatan Atap Dak Kantor DPMPTSP	Dokumentasi (100%) setelah dilakukan Perawatan Atap Dak Kantor DPMPTSP

a. Rumah Sakit Daerah Idaman

Nama Pekerjaan	: Pembangunan Ruang Kelas Rawat Inap Standar RSDI
Alamat	: RSDI Jl. Trikora Kelurahan Guntung Manggis
Pagu Anggaran	: Rp.2.356.000.000,-
Nama Pelaksana	: CV. Dwi Karya Perkasa
Nomor Kontrak	: 000.3 / 63 / III / TU / RSDI / 2025
Tanggal Kontrak	: 8 Maret 2025
Nilai Kontrak	: Rp.2.322.390.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender
Realisasi Fisik	: 50%
Realisasi Keuangan	: Rp.696.717.000,- (30%)

	
Foto Bersama pihak RSDI dengan Tim Monitoring	Dokumentasi (50%) Pembangunan Ruang Kelas Rawat Inap Standar RSDI

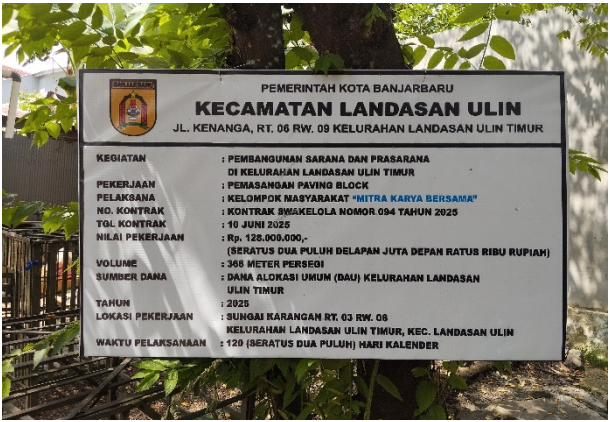
Nama Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah
Alamat	: RSDI Jl. Trikora Kelurahan Guntung Manggis
Pagu Anggaran	: Rp.2.300.000.000,-
Nama Pelaksana	: CV. Mitra Utama
Nomor Kontrak	: 000.3 / 57 / III / TU / RSDI / 2025
Tanggal Kontrak	: 8 Maret 2025
Nilai Kontrak	: Rp.2.266.670.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
Realisasi Fisik	: 50%
Realisasi Keuangan	: Rp.680.001.000,- (30%)

	
Foto Bersama pihak RSDI dengan Tim Monitoring	Dokumentasi (50%) Pembangunan Gedung Unit Transfusi Darah

14. Hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025

a. Kelurahan Landasan Ulin Timur

Nama Pekerjaan	: Pengerjaan Paving Block
Alamat	: Jl. Kampung Sungai Karang RT.03 RW.06 Kelurahan Landasan Ulin Timur
Pagu Anggaran	: Rp.140.000.000,-
Nama Pelaksana	: Kelompok Masyarakat Mitra Karya Bersama
Nomor Kontrak	: 094 Tahun 2025
Tanggal Kontrak	: 10 Juni 2025
Nilai Kontrak	: Rp.128.800.000,-
Waktu Pelaksanaan	: 120 Hari Kalender
Realisasi Fisik	: 34,78%
Realisasi Keuangan	: Rp.44.800.000,- (32%)
Catatan :	
Pemasangan paving block ini terbagi menjadi 2 tahap yaitu tahap 1 = 127,4 m ² dan tahap 2 = 240,6 m ² dan total sebanyak 368 m ² .	

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Landasan Ulin Timur dengan Tim Monitoring	Papan Proyek Pemasangan Paving Block di Kelurahan Landasan Ulin Timur

	
Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Landasan Ulin Timur	Dokumentasi (100%) Pelaksanaan Pemasangan Paving Block di Kelurahan Landasan Ulin Timur

b. Kelurahan Guntung Manggis

Nama Pekerjaan

: Pengerjaan Paving Block

Alamat

: Jl. Guntung Manggis Gang Keluarga RT.013 RW.002
Kelurahan Guntung Manggis

Pagu Anggaran

: Rp.39.000.000,-

Nama Pelaksana

: Kelompok Masyarakat Manggis Mas

Nomor Kontrak

: 091 Tahun 2025

Tanggal Kontrak

: 10 Juni 2025

Nilai Kontrak

: Rp.39.000.000,-

Waktu Pelaksanaan

: 90 Hari Kalender

Realisasi Fisik

: 100%

Realisasi Keuangan

: Rp.39.000.000,-(100%)

Catatan :

Luasan pemasangan paving block dilokasi ini sebesar 130 m² dengan lebar 2 meter dan panjang 65 meter.

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Guntung Manggis dengan Tim Monitoring	Papan Proyek Pemasangan Paving Block di Jl. Guntung Manggis Gang Keluarga
	
Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Guntung Manggis	Dokumentasi (100%) Pelaksanaan Pemasangan Paving Block di Jl. Guntung Manggis Gang Keluarga

Nama Pekerjaan : Pengerjaan Paving Block
Alamat : Jl. Trans AD Gang Saudara RT.023 RW.003
Kelurahan Guntung Manggis
Pagu Anggaran : Rp.51.000.000,-
Nama Pelaksana : Kelompok Masyarakat Manggis Mas
Nomor Kontrak : 091 Tahun 2025
Tanggal Kontrak : 10 Juni 2025
Nomor Kontrak : Rp.51.000.000,-
Waktu Pelaksanaan : 90 Hari Kalender
Realisasi Fisik : 100%
Realisasi Keuangan : Rp.51.000.000,- (100%)
Catatan :
Luasan pemasangan paving block dilokasi ini sebesar 170 m² dengan lebar 2 meter dan panjang 85 meter.

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Guntung Manggis dengan Tim Monitoring	Papan Proyek Pengerjaan Paving Block Jl. Trans AD Gang Saudara
	
Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Guntung Manggis	Dokumentasi (100%) Pelaksanaan Pemasangan Paving Block di Jl. Trans AD Gang Saudara

Nama Pekerjaan : Pemasangan Paving Block
Alamat : Jl. Abadi III RT.006 RW.007 Kelurahan Guntung Manggis
Pagu Anggaran : Rp.51.000.000,-
Catatan :
Pekerjaan pemasangan paving block di Jl. Abadi III RT.006 RW.007 Kelurahan Guntung Manggis ini belum dilaksanakan karena pokmas yang bertugas melaksanakan pekerjaan ini baru saja menyelesaikan pekerjaan pemasangan paving block di lokasi lain di Kelurahan Guntung Manggis ini.

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Guntung Manggis dengan Tim Monitoring	Dokumentasi (0%) Pengerjaan Paving Block di Jl. Abadi III RT.006 RW.007

c. Kelurahan Syamsudin Noor

Nama Pekerjaan : Pengerjaan Paving Block
 Alamat : Gang Mufakat RT.029 RW.06 dan Gang Kelapa RT.034 RW.07 Kelurahan Syamsudin Noor
 Pagu Anggaran : Rp.129.000.000,-
 Nama Pelaksana : Kelompok Masyarakat Angkasa
 Nomor Kontrak : 093 Tahun 2025
 Tanggal Kontrak : 10 Juni 2025
 Nilai Kontrak : Rp.129.000.000,-
 Waktu Pelaksanaan :150 Hari Kalender
 Realisasi Fisik : 100%
 Realisasi Keuangan : 100%
 Catatan :

	
Foto Bersama pihak Kelurahan Syamsudin Noor dengan Tim Monitoring	Papan Proyek Pengerjaan Paving Block Gang Mufakat RT.029 RW.06 dan Gang Kelapa RT.034 RW.09
	
Dokumentasi Sesi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dengan pihak Kelurahan Syamsudin Noor	Dokumentasi (100%) Pelaksanaan Pemasangan Paving Block di Kelurahan Syamsudin Noor

No	Yang Melaporkan	Tanda Tangan
1	Hj. Renyta Setyawati, SP, MT	
2	Evelina Rahmi, ST, M.IL	
3	Jasman, SST	
4	Romy Rahmadani, A.Md	
5	Hj. Rumiah, S.Sos	
6	Faridi Rahmani, S.Pd	
